

AMETEL, S.A.

ANDALUZA DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS

INFORME AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

De volumen a margen

Auditoría operativa, diagnóstico de gobernanza
y plan de transformación corporativa

126 M€

Facturación 2024

+530 %

Crecimiento 2016-2024

1,26 M€

Valor de cada punto de margen

ÍNDICE

Informe al Consejo de Administración de Ametel, S.A.

RE	Resumen ejecutivo.....	3
	<i>La tesis, las cifras y las tres decisiones que se piden al Consejo</i>	
1	Diagnóstico de situación.....	6
	<i>Framework Situación–Complicación–Resolución · evolución de la facturación y CAGR</i>	
2	Auditoría de procesos y modelo operativo.....	8
	<i>El modelo de baja subcontratación · diversificación y expansión internacional</i>	
3	Matriz de diagnóstico.....	11
	<i>Cada debilidad, emparejada con la fortaleza interna que puede mitigarla</i>	
4	Plan de soluciones y priorización.....	12
	<i>Rentabilidad · Cuadro de Mando Integral · gobernanza · matriz impacto-esfuerzo</i>	
5	Gobernanza, riesgos y cultura preventiva.....	16
	<i>Ametel Global Group, S.L. · la prevención como activo · mapa de riesgos</i>	
6	Hoja de ruta y requerimientos.....	20
	<i>Plan de los primeros 100 días · información necesaria para cuantificar</i>	

NOTA METODOLÓGICA

Este informe se elabora exclusivamente sobre la información facilitada por la organización. No se han utilizado cifras de EBITDA, márgenes, deuda, backlog ni costes de personal porque no fueron suministradas. Allí donde el análisis requiere una magnitud no disponible, se explicita como estimación conceptual de industria o se traslada al apartado 6.2. **Ninguna cifra financiera de este documento ha sido inventada.** El documento constituye un diagnóstico y una recomendación; no es auditoría de cuentas ni asesoramiento legal, fiscal o financiero.

RESUMEN EJECUTIVO

Lo que este informe sostiene, en una página

LA TESIS

Ametel ha construido, en ocho años, el activo más difícil de construir en este sector: capacidad propia de ejecución en infraestructura crítica, con la calidad y la seguridad homologadas por las mayores utilities del país. **No lo está cobrando.** El problema de la compañía no es de crecimiento; es de conversión. Y la reorganización societaria de junio de 2026 abre la única ventana en años para corregirlo con coste marginal cero.

×6,3

Facturación 2016–2024

25,9 %

CAGR histórico

8,3 %


CAGR proyectado 2024–2027

La aritmética que debe presidir el Consejo

Con 126 M€ de facturación, **cada punto porcentual de margen recuperado equivale a 1,26 M€**; sobre los 160 M€ proyectados, a 1,60 M€. Tres puntos de margen valen más que treinta millones adicionales de facturación al margen actual. La palanca de valor de esta compañía ha dejado de estar en la cuenta de ingresos.

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN Y TASA DE CRECIMIENTO ANUAL COMPUESTO

Millones de euros · datos facilitados por la organización

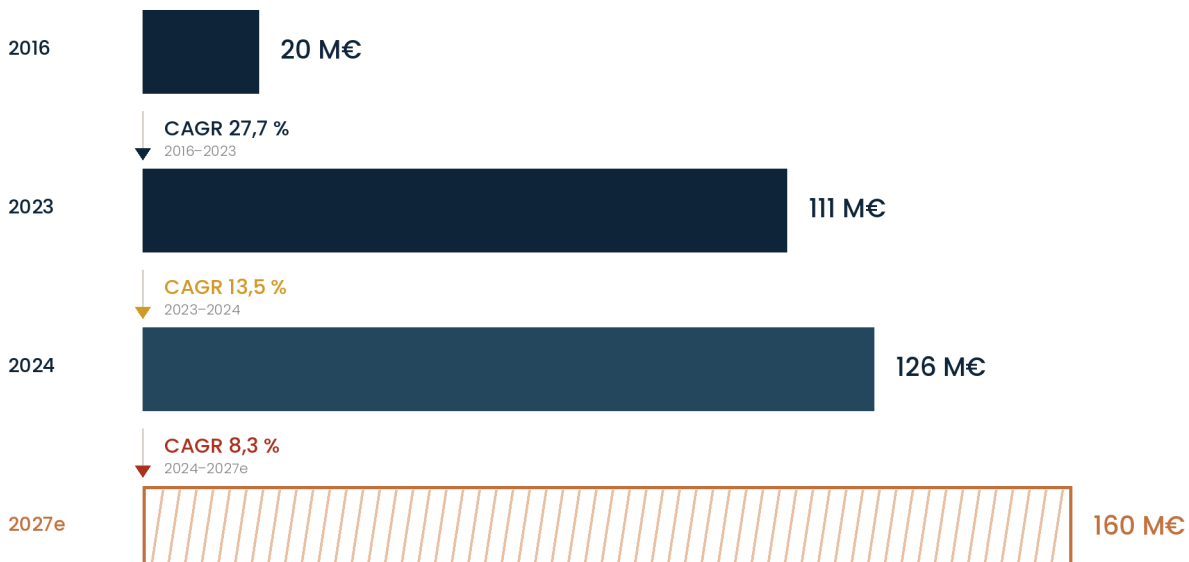

El plan proyecta una tasa de crecimiento tres veces inferior a la histórica: un cambio de régimen, no una previsión conservadora.

Tres hallazgos

01

La desaceleración ya está dentro del plan

El plan estratégico proyecta una tasa de crecimiento tres veces inferior a la histórica: del 25,9 % al 8,3 %. No es una previsión prudente, es un cambio de régimen. **La organización fue diseñada y dimensionada para crecer al 26 %; debe ser rediseñada para rentabilizar al 8 %.** En un régimen de crecimiento acelerado los defectos de margen quedan enmascarados por el volumen; a un 8 %, quedan expuestos.

02

El apalancamiento operativo está funcionando al revés

Una compañía con ejecución directa y baja subcontratación tiene, por definición, alto apalancamiento operativo: por encima del punto muerto, cada euro adicional de ingreso debería expandir el margen de forma más que proporcional. Que la rentabilidad no haya acompañado a un crecimiento del 530 % no es una anomalía menor. **O el precio se ha entregado para comprar volumen, o la estructura indirecta ha crecido al mismo ritmo que la directa. O ambas cosas.**

03

La prevención es un activo contabilizado como coste

Las 9.500 horas formativas y la parada de producción de la Semana de la Prevención figuran hoy en la cuenta de resultados como coste de estructura y lucro cesante. En un mercado donde las grandes utilities homologan proveedores puntuando explícitamente el desempeño en seguridad, una siniestralidad baja y auditada no es el resultado de la política preventiva: **es un activo comercial cuantificable. La compañía está pagando la prima y no está cobrando la póliza.**

Lo que proponemos

El Consejo planteó tres desafíos. A cada uno le corresponde una respuesta con un mecanismo concreto y un plazo.

Desafío planteado por el Consejo	Respuesta propuesta	Mecanismo principal	Plazo
Rentabilidad que no acompaña al volumen	Gobierno del precio antes que recorte de costes	Comité de Ofertas con umbral de margen mínimo + repricing por valor de los Trabajos en Tensión	0-9 m
Ausencia de KPIs de control de gestión	Cuadro de Mando Integral en cascada de tres niveles	Explotar la ventaja informativa del modelo de ejecución directa: la compañía posee el dato primario de obra	3-12 m
Gobernanza bajo Ametel Global Group	Separar el gobierno del capital del gobierno de la operación	Reglamento del Consejo, Comisión de Auditoría y Riesgos y mapa de delegación de facultades	0-12 m

Las tres decisiones que pedimos a este Consejo

- **Instaurar el gobierno del precio.** Ninguna oferta por debajo del umbral de margen que fije el Consejo debe poder presentarse sin su aprobación expresa. Es la medida de mayor impacto y menor esfuerzo de todo el plan.
- **Decidir la hipótesis del plan 2027.** Alcanzar 160 M€ con la plantilla actual exige un salto de productividad del 27 %; hacerlo a productividad constante exige incorporar unos 300 profesionales cualificados. Son

estrategias opuestas. Financiar ambas sin decidir es la vía más segura hacia la dilución de margen que el Consejo ya observa.

- **Fijar el calendario de consolidación.** La creación de la sociedad cabecera y el mandato de auditoría 2026–2028 coinciden en el mismo ejercicio. La ventana para construir el manual contable de grupo se cierra antes del cierre de 2026: es la restricción temporal más dura del plan y la más fácil de subestimar.

ADVERTENCIA CRÍTICA

*Si se confirman a la vez las dos hipótesis del hallazgo 02 —precio entregado y estructura indirecta creciendo en paralelo a la directa—, la compañía tiene un problema de modelo de negocio, no de eficiencia. **En ese escenario los programas de reducción de costes fracasan, porque atacan el síntoma.** La intervención debe recaer sobre la política de precios y sobre la arquitectura de la estructura.*

01

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN

1.1 Framework Situación · Complicación · Resolución

1.1.1 Situación

Ametel ha completado la transición desde una compañía regional de montajes eléctricos hasta un contratista de infraestructuras críticas de escala nacional con proyección internacional. En ocho ejercicios ha multiplicado por 6,3 su cifra de negocio, ha construido una plantilla directa superior a 1.100 personas, ha conectado más de 7 GW de generación renovable a la red y ha diversificado hacia el gas mediante Dualgás, con contrato con Nedgia/Naturgy en Andalucía.

La compañía posee tres activos difícilmente replicables: **capacidad de ejecución directa, competencia en Trabajos en Tensión** —intervención sin corte de suministro— y **un historial de calidad y seguridad** que constituye la llave de acceso a los cuadros de homologación de las grandes utilities.

1.1.2 Complicación

El Consejo identifica que la rentabilidad no ha crecido de forma proporcional al volumen. Es el hallazgo central de este diagnóstico, y su gravedad es mayor de lo que sugiere su enunciado.

LA PARADOJA DEL APALANCAMIENTO OPERATIVO

*Una compañía con estructura de costes intensiva en personal propio y baja subcontratación tiene, por definición, alto apalancamiento operativo. Que la rentabilidad no haya acompañado a un crecimiento del 530 % es la señal de que ese apalancamiento **no está funcionando en la dirección esperada**.*

A ello se añaden dos circunstancias agravantes. La primera, que el propio plan estratégico anticipa una desaceleración severa: la compañía deja de ser una historia de crecimiento para convertirse en una historia de conversión. La segunda, que la organización asume simultáneamente **cuatro vectores de complejidad** —nuevo sector, dos nuevas geografías, nueva estructura societaria y nuevo auditor—. Cada uno consume capacidad directiva y ninguno genera margen en su primer ciclo.

1.1.3 Resolución

El mandato para los próximos dieciocho meses no es crecer. Es **convertir volumen en margen y margen en caja**, bajo una arquitectura de gobierno que permita al Consejo dirigir con información fiable.

1.2 Evolución de la facturación y tasas de crecimiento

Periodo	Inicio (M€)	Fin (M€)	Años	Crecimiento acumulado	CAGR	Lectura
2016 - 2023	20	111	7	+455 %	27,7 %	Expansión acelerada
2016 - 2024	20	126	8	+530 %	25,9 %	Ciclo completo de escalado
2023 - 2024	111	126	1	+13,5 %	13,5 %	Primer punto de inflexión
2024 - 2027e	126	160	3	+27,0 %	8,3 %	Normalización planificada

1.2.1 Productividad implícita y tensión de dimensionamiento

Indicador	2024 (real)	2027e · plantilla constante	2027e · productividad constante
Facturación	126 Me	160 Me	160 Me
Plantilla directa	~1.100	~1.100	~1.400
Ingreso por empleado	~114,5 k€	~145,5 k€ (+27 %)	~114,5 k€
Implicación	—	Exige un salto de productividad del 27 % sin refuerzo de plantilla	Exige incorporar ~300 profesionales cualificados en un mercado tensionado

Ratios calculados a partir de las magnitudes facilitadas. Se presentan como indicador de dimensionamiento, no como métrica financiera auditada.

INSIGHT

El plan 2027 no ha resuelto todavía **cuál de las dos hipótesis persigue**, y son estratégicamente opuestas: la primera es un programa de eficiencia y de mix de valor; la segunda, un programa de captación y formación de talento técnico.

02

AUDITORÍA DE PROCESOS Y MODELO OPERATIVO

2.1 El modelo de baja subcontratación

La ejecución directa con más de 1.100 empleados propios es la decisión estructural más importante que ha tomado la compañía. **Es correcta en su fundamento y deficiente en su implementación financiera.**

Dimensión	Ventaja competitiva	Coste o riesgo financiero
Calidad técnica	Control extremo a extremo del proceso; curva de aprendizaje interna acumulativa; menor tasa de repetición de trabajos	La calidad no se monetiza si el precio se fija por licitación a la baja: se convierte en sobrevalidez no retribuida
Seguridad laboral	Cultura preventiva homogénea; siniestralidad controlable; requisito habilitante en homologaciones	Coste formativo y de parada de producción soportado íntegramente por la compañía
Capacidad de respuesta	Movilización inmediata ante incidencias de red; ventaja decisiva en contratos marco	Exige mantener capacidad de reserva retribuida a coste fijo
Estructura de costes	Márgenes de contribución superiores por unidad ejecutada	Coste fijo dominante: el punto muerto sube con cada incorporación
Flexibilidad ante el ciclo	—	Riesgo crítico. Ante una caída de demanda el coste no se ajusta y el margen se destruye de forma no lineal
Escalabilidad	—	Crece exige contratar antes de facturar: el crecimiento consume caja y comprime margen

2.1.1 Hipótesis explicativas de la dilución de margen

En ausencia de cuenta de resultados analítica se formulan cuatro hipótesis contrastables con información interna ya disponible. Deben priorizarse en este orden.

	Hipótesis	Evidencia a solicitar	Probabilidad
H1	Precio entregado por volumen. El crecimiento se ha financiado con concesiones de precio en contratos marco con grandes cuentas	Evolución del precio unitario por unidad de obra tipo, 2016–2024	Alta
H2	Crecimiento lineal de la estructura indirecta. Los costes de administración, técnica y soporte han crecido al ritmo de la producción, anulando el apalancamiento	Ratio de empleados indirectos sobre directos, evolución 2016–2024	Alta
H3	Curva de aprendizaje de las nuevas líneas. Dualgás, Chile y Reino Unido operan por debajo de su margen objetivo y diluyen el consolidado	Cuenta de resultados por unidad de negocio y país	Media-alta
H4	Desviación de coste en obra. Desviaciones sistemáticas entre presupuesto de licitación y coste real de ejecución	Desviación coste real frente a presupuestado por proyecto cerrado	Media

2.1.2 Recomendación estructural: la subcontratación como amortiguador

La recomendación **no es abandonar la ejecución directa**: es el activo diferencial de la compañía. La recomendación es desacoplar el coste fijo del ciclo de demanda mediante una banda de flexibilidad controlada del 10–15 % de la capacidad.

Permanece en ejecución directa toda actividad que sea crítica para la seguridad, diferencial en la homologación con el cliente o intensiva en conocimiento acumulado —Trabajos en Tensión, subestaciones llave en mano, respuesta ante emergencias—. Se abre a subcontratación cualificada y auditada la obra civil auxiliar, los picos estacionales y los despliegues de baja especialización técnica.

2.2 Diversificación y expansión: riesgos de integración

2.2.1 Dualgás · diversificación sectorial hacia gas

Vector	Valoración	Riesgo
Sinergia comercial	Alta. Nedgia/Naturgy comparte con las eléctricas el modelo de contrato marco, la homologación de proveedor y la exigencia en seguridad. La credencial de Ametel es directamente transferible	Bajo
Sinergia operativa	Media. Comparte gestión de cuadrillas, flota y planificación de obra lineal, pero no comparte competencia técnica: la especialización en gas es distinta	Medio
Riesgo de integración	Estructura de alianza: exige clarificar gobierno, reparto de resultados y quién soporta el coste de estructura compartida	Alto si no está formalizado
Concentración de cliente	Un único contrato ancla sostiene la línea. Riesgo binario de renovación	Alto

*La diversificación hacia gas es **estratégicamente sólida** —descorrelaciona el ciclo de inversión eléctrica— pero está **operativamente inmadura**. El error a evitar es contabilizarla como línea rentable antes de que haya completado su primer ciclo contractual completo.*

2.2.2 Chile y Reino Unido · expansión internacional

Riesgo	Descripción	Nivel
Dilución de margen por curva de aprendizaje	Los dos primeros ejercicios en un mercado nuevo operan estructuralmente por debajo del margen doméstico	Alto
Transferencia del modelo de ejecución directa	El modelo depende de una plantilla formada y de una cultura preventiva propia: es el activo más difícil de exportar	Alto
Regulatorio y normativo	Regímenes de seguridad, cualificaciones y marcos de contratación distintos en cada mercado	Medio
Divisa y país	Exposición a moneda sobre contratos plurianuales sin cobertura documentada	Medio
Consumo de capacidad directiva	El coste no contabilizado: atención del equipo directivo desviada del núcleo doméstico, que aporta la práctica totalidad del margen	Alto

RECOMENDACIÓN DE SECUENCIA

*Antes de abrir una tercera geografía, exigir que Chile y Reino Unido demuestren margen de contribución positivo y recurrente durante cuatro trimestres consecutivos. **La expansión internacional simultánea a la diversificación sectorial y a la reorganización societaria es, en 2026–2027, un exceso de frentes abiertos.***

03

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO

Cada debilidad se empareja con la fortaleza interna que puede mitigarla. **No se propone ninguna solución que no se apoye en un activo que la compañía ya posee.**

	Debilidad	Fortaleza-palanca	Mecanismo de mitigación
D1	Rentabilidad rezagada respecto al volumen	Competencia en Trabajos en Tensión: servicio escaso y de alta especialización que evita el corte de suministro	Tarificar los Trabajos en Tensión por el valor evitado al cliente, no por coste horario. Es la línea con mayor elasticidad de margen
D2	Costes fijos elevados e inflexibilidad ante el ciclo	Cartera de contratos marco plurianuales y más de 7 GW conectados como credencial	Planificar la capacidad sobre backlog comprometido, no sobre expectativa. Banda de subcontratación del 10-15 % como amortiguador
D3	Gobernanza compleja en transición	Creación de Ametel Global Group ya aprobada y auditor designado para 2026-2028	La reorganización es la ventana natural para instalar reglamento, comisión de auditoría y delegación de facultades: hacerlo ahora tiene coste marginal cero
D4	Riesgo de seguridad en trabajos en altura y en tensión	9.500 horas formativas y Semana de la Prevención	Auditar y certificar externamente el sistema preventivo para convertirlo en credencial de licitación y en reducción de prima aseguradora
D5	Ausencia de KPIs de control de gestión precisos	La ejecución directa implica que la compañía posee el dato primario: horas, cuadrillas, unidades, incidencias	Construir el Cuadro de Mando sobre datos propios de obra y no sobre certificaciones de terceros. Una empresa subcontratista no puede hacerlo
D6	Concentración de clientes	Seis áreas de capacidad operativa y presencia en tres geografías	Diversificar por servicio dentro de cada cuenta antes que por cuenta: venta cruzada sobre clientes ya homologados
D7	Curva de aprendizaje en Dualgás, Chile y Reino Unido	Más de cuarenta años de trayectoria y metodología de ejecución replicable	Codificar el modelo operativo doméstico en un manual de despliegue y exportar equipo núcleo, no solo procedimiento
D8	Dependencia del talento técnico en mercado tensionado	Reputación de calidad y seguridad; alianza formativa consolidada	Convertir la política preventiva y formativa en propuesta de valor al empleado y en cantera propia

04

PLAN DE SOLUCIONES Y PRIORIZACIÓN

4.1 Desafío 1 · Optimización de la rentabilidad

	Iniciativa	Descripción	Plazo
S1	Cuenta de resultados analítica por proyecto	Cierre mensual de margen de contribución por obra, cliente y área operativa. Sin esto, ninguna decisión de margen es informada	0-3 m
S2	Comité de Ofertas y precio mínimo aceptable	Gobierno formal de la licitación: umbral de margen por debajo del cual una oferta requiere aprobación del Consejo. Termina con la compra de volumen a precio	0-3 m
S3	Repricing por valor de TET y subestaciones	Reposicionar las líneas de alta especialización sobre el valor evitado al cliente: continuidad de suministro y penalización regulatoria evitada	3-9 m
S4	Modelo de coste horario y utilización de cuadrilla	Coste real por hora productiva y ratio de horas productivas sobre totales. Identifica dónde se pierde el apalancamiento operativo	3-12 m
S5	Revisión de cláusulas de actualización de precios	Auditoría de los contratos marco: revisión de precios, escalada de costes de material y mano de obra, penalizaciones	0-6 m
S6	Gestión del WIP y del ciclo de certificación	Reducción de la obra ejecutada pendiente de certificar y del periodo medio de cobro. Convierte margen en caja	0-6 m
S7	Racionalización de la estructura indirecta	Auditoría del ratio de indirectos sobre directos y de su evolución. Objetivo: crecimiento sublineal de la estructura	6-12 m

4.2 Desafío 2 · Cuadro de Mando Integral

Se propone un Cuadro de Mando de cuatro perspectivas con **cascada de tres niveles**: Consejo, con periodicidad trimestral y ocho indicadores; Comité de Dirección, mensual, con veinticuatro; y jefatura de obra, semanal, con indicadores operativos.

4.2.1 Perspectiva financiera

Indicador	Definición	Frecuencia	Nivel
Margen de contribución por proyecto	Ingreso de obra menos coste directo, sobre ingreso	Mensual	Consejo
EBITDA por unidad de negocio	Segregado: España, Dualgás, Chile, Reino Unido	Trimestral	Consejo
Book-to-bill	Contratación del periodo sobre facturación del periodo	Mensual	Consejo
Backlog en meses de facturación	Cartera contratada sobre facturación media mensual	Mensual	Consejo
Desviación de coste real frente a presupuestado	Por proyecto cerrado y en curso	Mensual	Dirección
WIP · obra pendiente de certificar	En millones de euros y en días	Mensual	Dirección

Indicador	Definición	Frecuencia	Nivel
Periodo medio de cobro	Por cliente	Mensual	Dirección

4.2.2 Perspectiva de cliente y mercado

Indicador	Definición	Frecuencia	Nivel
Tasa de éxito en licitación	Ofertas ganadas sobre presentadas, por cliente y tipo de obra	Mensual	Consejo
Concentración de cartera	Porcentaje de facturación de los tres primeros clientes	Trimestral	Consejo
Cumplimiento de plazo contractual	Obras entregadas en plazo sobre el total	Mensual	Dirección
Penalizaciones y no conformidades	Importe y número, por cliente	Mensual	Dirección
Posición en cuadros de homologación	Estado de calificación en cada gran cuenta	Semestral	Dirección

4.2.3 Perspectiva de procesos operativos

Indicador	Definición	Frecuencia	Nivel
Horas productivas sobre horas totales	Indicador maestro del apalancamiento operativo	Semanal	Dirección
Productividad por cuadrilla	Unidades de obra ejecutadas por cuadrilla y día	Semanal	Obra
Utilización de flota y plataformas	Horas de uso sobre horas disponibles	Mensual	Dirección
Tasa de repetición de trabajos	Coste de no calidad sobre coste total de obra	Mensual	Dirección
Peso de las actividades de alto valor	Trabajos en Tensión y subestaciones sobre el total facturado	Trimestral	Consejo

4.2.4 Perspectiva de personas y seguridad

Indicador	Definición	Frecuencia	Nivel
Índices de frecuencia y de gravedad	Accidentes con baja por millón de horas trabajadas	Mensual	Consejo
Incidentes sin baja y situaciones de riesgo	Indicador adelantado de siniestralidad	Mensual	Dirección
Horas de formación por empleado	Total y desglose en habilitaciones críticas	Trimestral	Consejo
Ratio de indirectos sobre directos	Indicador de crecimiento de la estructura	Trimestral	Consejo
Rotación de personal técnico cualificado	Anualizada, por categoría	Trimestral	Dirección

4.3 Desafío 3 · Gobernanza bajo Ametel Global Group

	Iniciativa	Descripción	Plazo
G1	Reglamento del Consejo del holding	Composición, periodicidad, calendario anual y agenda estratégica. Responde directamente a la petición del Consejo de revisar la agenda de temas estratégicos	0-6 m
G2	Comisión de Auditoría y Riesgos	Interlocución con el auditor, supervisión del control interno y del mapa de riesgos. Aporta credibilidad ante financiadores y grandes cuentas	0-6 m
G3	Mapa de delegación de facultades	Qué decide el holding, qué decide el consejo de la operativa y qué decide el comité de dirección. Evita el consejo espejo	0-6 m
G4	Separación efectiva de propiedad y gestión	El holding gobierna capital, estrategia y riesgos; la operativa gobierna ejecución. Sin esta separación la nueva estructura solo añade una capa	6-12 m
G5	Manual de políticas contables de grupo	Homogeneización de criterios entre España, Chile, Reino Unido y Dualgás como prerequisite de la consolidación	0-9 m
G6	Pacto de socios o protocolo	Régimen de entrada, salida, transmisión y sucesión en el nivel del holding	6-18 m

4.4 Matriz de priorización

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN · IMPACTO vs. ESFUERZO



NOTA SOBRE LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE

La consolidación figura en el cuadrante de alto esfuerzo, pero **no es opcional**: la constitución de un grupo de sociedades con una cabecera dominante activa la obligación de formular cuentas consolidadas, y las dispensas por tamaño previstas en la normativa mercantil española no resultan aplicables a una organización de este volumen. Debe confirmarse con el auditor designado y con la asesoría jurídica del grupo.

05

GOBERNANZA, RIESGOS Y CULTURA PREVENTIVA

5.1 La prevención como activo intangible

Magnitud	Dato facilitado
Horas formativas	9.500, con un incremento del 50 % sobre periodos anteriores
Trabajadores alcanzados	Más de 500, en Madrid, Sevilla y Jerez
Intensidad media	Aproximadamente 19 horas por trabajador
Contenidos	Rescate en altura, primeros auxilios, operación de plataformas y liderazgo preventivo
Modalidad	Parada periódica de producción · Semana de la Prevención
Socio formativo	Fundación Laboral de la Construcción

ESTIMACIÓN CONCEPTUAL DEL COSTE DE OPORTUNIDAD

Aplicando el ingreso medio por empleado derivado de los datos facilitados sobre una jornada anual estándar del sector, la parada de producción de 9.500 horas representa un coste de oportunidad del orden de 0,5 a 0,6 M€, equivalente aproximadamente al 0,5 % de la facturación de 2024. Estimación de industria basada en las magnitudes provistas; requiere validación con el coste horario real de la compañía.

Hoy ese medio millón de euros aparece en la cuenta de resultados como coste de estructura y lucro cesante. Esa es su contabilización correcta y su lectura estratégica equivocada.

5.1.1 Programa de monetización del activo preventivo

Palanca	Acción	Retorno esperado	Plazo
Certificación externa	Certificar y mantener el sistema de gestión de seguridad y salud bajo estándar internacional reconocido, auditado por tercero independiente	Convierte una afirmación en una credencial verificable ante el cliente	6-12 m
Precalificación de proveedor	Trasladar índices de frecuencia y gravedad auditados a los sistemas de homologación de las grandes cuentas	Mejor puntuación técnica en licitación y, por tanto, menor presión sobre el precio	0-6 m
Argumentario de licitación	Dossier unificado y cuantificado: horas formativas, habilitaciones, siniestralidad y plan de emergencia	Diferenciación en el apartado técnico, que es donde se defiende el margen	0-3 m
Coste asegurador	Negociar primas de responsabilidad civil y accidentes sobre siniestralidad histórica demostrada	Ahorro directo y recurrente en la cuenta de resultados	6-12 m


Palanca	Acción	Retorno esperado	Plazo
Exposición a contingencia	Reducción de la exposición a recargos, sanciones y responsabilidad derivada de accidente	Riesgo evitado, materialmente relevante en trabajos en altura y en tensión	Permanente
Reporte de sostenibilidad	Integrar métricas de seguridad y formación en el reporte no financiero del grupo	Requisito creciente en la cadena de suministro de las utilities cotizadas	12-18 m
Atracción de talento	Posicionar la política preventiva como propuesta de valor al empleado	Reduce rotación y coste de reposición	6-18 m

RECOMENDACIÓN

Reformular la Semana de la Prevención como **Programa Ametel de Excelencia Operativa**, con memoria anual, indicadores auditados y comparativa sectorial. El contenido no cambia. **Cambia su capitalización.**

5.2 Ametel Global Group, S.L. · análisis de la reorganización

ARQUITECTURA SOCIETARIA · JUNTA GENERAL DE JUNIO DE 2026

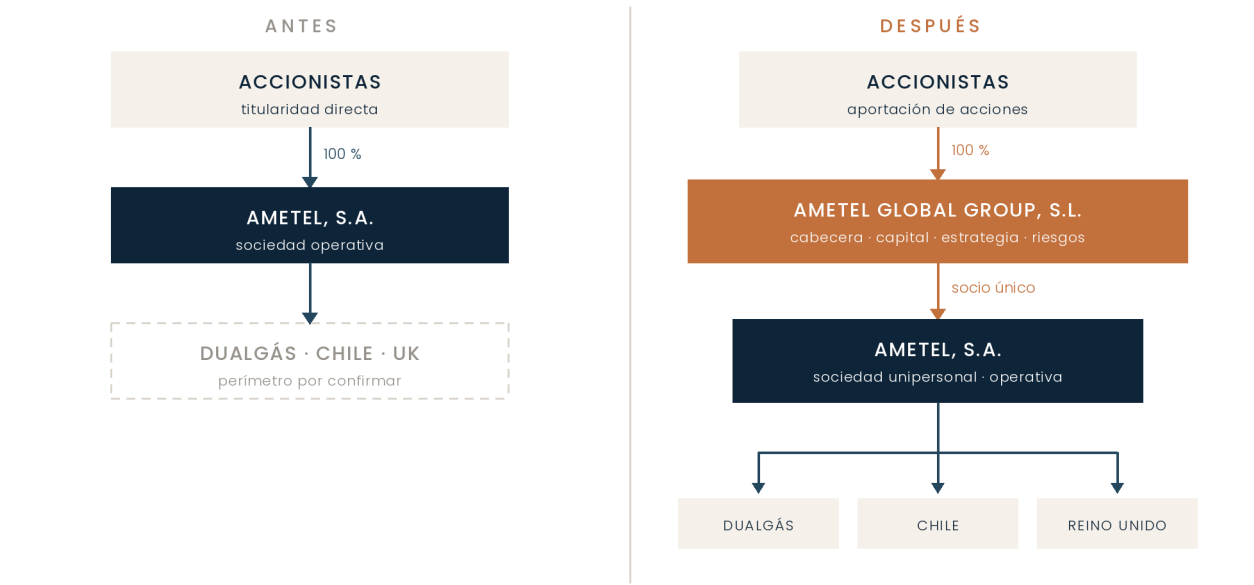

La reorganización solo genera valor si se acompaña del mapa de delegación de facultades: sin él se crea una sociedad, no una gobernanza.

5.2.1 Valoración de la operación

Dimensión	Valoración
Toma de decisiones	Separa el gobierno del capital del gobierno de la operación. Permite que el Consejo del holding dedique su agenda a estrategia, riesgos y asignación de capital en lugar de a la gestión de obra
Vehículo de crecimiento	Facilita adquisiciones, alianzas y entrada de socios financieros sin alterar la sociedad operativa ni sus contratos, homologaciones y clasificaciones administrativas
Financiación	Permite estructurar deuda en el nivel de cabecera y aislar el riesgo por sociedad y por geografía

Dimensión	Valoración
Fiscalidad	Una estructura de grupo con participación del 100 % habilita en principio el acceso al régimen de consolidación fiscal, y las aportaciones de acciones a una sociedad cabecera pueden acogerse a regímenes de diferimiento siempre que concurren los requisitos legales, incluido el motivo económico válido. Debe validarse íntegramente con la asesoría fiscal del grupo
Sucesión y continuidad	Marco natural para el pacto de socios y el régimen de transmisión
Carga de reporte	Activa la obligación de cuentas consolidadas y exige políticas contables uniformes, manual de grupo y eliminación de operaciones intragrupo
Formalidades de la unipersonalidad	La condición de sociedad unipersonal conlleva obligaciones específicas de publicidad registral y de documentación de los contratos entre socio único y sociedad. A verificar con la asesoría jurídica

INSIGHT DE CALENDARIO

*La designación de auditor para el trienio 2026–2028 coincide con el primer ejercicio del nuevo grupo. El primer cierre auditado bajo la nueva arquitectura será, con toda probabilidad, el de 2026, y será también el primero que exija consolidación. **La ventana para construir el manual de políticas contables de grupo, homogeneizar criterios con Chile, Reino Unido y Dualgás y definir el circuito de operaciones intragrupo se cierra antes del cierre del ejercicio.** Es la restricción temporal más dura de todo este plan y la más fácil de subestimar.*

EL RIESGO DEL CONSEJO ESPEJO

*El fracaso característico de estas reorganizaciones no es fiscal ni contable: es organizativo. Se produce cuando el mismo grupo de personas se reúne dos veces —como Consejo del holding y como órgano de la operativa— para tratar los mismos asuntos, duplicando el coste de gobierno sin añadir capacidad de decisión. **Sin el mapa de delegación de facultades se habrá creado una sociedad, no una gobernanza.***

5.3 Mapa de riesgos consolidado

	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Mitigación
R1	Continuidad de la dilución de margen	Alta	Muy alto	Crítico	\$4.1
R2	Rigidez del coste fijo ante caída de demanda	Media	Muy alto	Crítico	\$2.1.2
R3	Accidente grave en trabajos en altura o en tensión	Baja	Muy alto	Crítico	\$5.1
R4	No renovación del contrato ancla de Dualgás	Media	Alto	Crítico	\$2.2.1
R5	Incumplimiento del calendario de consolidación 2026	Media-alta	Alto	Crítico	\$5.2
R6	Pérdida o degradación de homologación en gran cuenta	Baja	Muy alto	Relevante	\$5.1.1
R7	Prolongación de pérdidas en Chile y Reino Unido	Media	Medio	Relevante	\$2.2.2
R8	Rotación de talento técnico cualificado	Media	Medio	Relevante	\$4.2.4
R9	Duplicidad de gobierno · consejo espejo	Media	Medio	Relevante	\$5.2
R10	Exposición a divisa sin cobertura	Media	Bajo	Moderado	\$2.2.2

06

HOJA DE RUTA Y REQUERIMIENTOS

6.1 Plan de los primeros 100 días

Mes 1	Mes 2	Mes 3
Cierre analítico de margen por proyecto (S1) · Inventario de contratos marco y de sus cláusulas (S5) · Requerimiento formal de información (S6.2) · Diagnóstico de WIP y periodo de cobro (S6)	Constitución del Comité de Ofertas y fijación del umbral de margen mínimo (S2) · Reglamento del Consejo y agenda estratégica (G1) · Arranque del manual contable de grupo (G5) · Dossier de seguridad para homologaciones	Primer Cuadro de Mando piloto al Consejo · Contraste de las hipótesis H1 a H4 con dato real · Decisión sobre la hipótesis de dimensionamiento 2027 · Plan de repricing de Trabajos en Tensión (S3)
Entregable: mapa real del margen	Entregable: gobierno del precio y del Consejo	Entregable: Cuadro de Mando v1 y plan 2027 decidido

6.2 Requerimientos de información

Para elevar este diagnóstico a plan cuantificado se requiere de la organización la siguiente documentación.

Financiero

- Cuentas anuales 2021–2025 y avance del ejercicio 2026.
- Cuenta de resultados desagregada por unidad de negocio y por geografía.
- Estructura de costes: peso de personal directo, indirecto, materiales y subcontratación, con evolución 2016–2024.
- Backlog contratado a fecha, con vencimientos y márgenes esperados.
- Posición de circulante: obra pendiente de certificar, periodos medios de cobro y pago, y evolución de la deuda financiera neta.

Operativo

- Facturación y margen por área de capacidad: subestaciones, alta tensión, media y baja tensión, Trabajos en Tensión, telecomunicaciones y renovables.
- Evolución del ratio de empleados indirectos sobre directos.
- Desviación de coste real frente a presupuestado en los proyectos cerrados de los tres últimos ejercicios.
- Precio unitario de las unidades de obra tipo más representativas, serie 2016–2024.
- Tasa de éxito en licitación por cliente y por tipo de obra.

Comercial y contractual

- Concentración: porcentaje de facturación por cliente en los tres últimos ejercicios.
- Contratos marco vigentes: alcance, vencimiento, cláusulas de revisión de precios y penalizaciones.
- Estado de la homologación en cada gran cuenta.

Societario y de gobierno

- **Perímetro definitivo del grupo:** titularidad y porcentaje de participación en Dualgás, Chile y Reino Unido, antes y después de la reorganización. Dato no determinado en la documentación facilitada y necesario para dimensionar la consolidación.

- Acuerdos de la alianza que sustenta Dualgás.
- Composición actual del órgano de administración y facultades delegadas.

Seguridad y personas

- Índices de frecuencia y de gravedad de los últimos cinco ejercicios.
- Coste anual del sistema preventivo y de la Semana de la Prevención.
- Rotación de personal técnico por categoría.

CONCLUSIÓN PARA EL CONSEJO

Ametel no tiene un problema de crecimiento: tiene un **problema de conversión**. Ha construido, en ocho años, el activo más difícil de construir en este sector —capacidad propia de ejecución en infraestructura crítica, con seguridad y calidad homologadas por las mayores utilities del país— y no lo está cobrando.

La reorganización societaria de junio de 2026 no es un trámite. Es la única ventana en años en la que instalar, con coste marginal cero, el gobierno del precio, el gobierno del dato y el gobierno del Consejo. Si esas tres piezas se instalan ahora, los 160 M€ de 2027 valdrán sustancialmente más que los 126 M€ de hoy. Si no se instalan, serán simplemente **treinta y cuatro millones más de facturación al mismo margen**.

Cada punto de margen vale 1,26 M€ hoy. **Esa es la conversación que este Consejo debería estar teniendo.**

Documento elaborado sobre la información facilitada por la organización. Las estimaciones señaladas como tales son referencias conceptuales de industria y requieren validación con datos internos antes de cualquier uso oficial, decisión de inversión o comunicación a terceros. No constituye auditoría de cuentas ni asesoramiento legal, fiscal o financiero.
